

AKTS Nr. 2

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Kalupes pagasts

2025. gada 14. jūlija

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 “Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai” izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja;

2025.gada 14.jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr A1002248001264 Grancova -Petrovka apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ceļa klātne ir izskalota p.k. 0,010-0,060 km un p.k. 0,480-0,530 km.




Līdz ar lielajām lietavām uz Kalupes apvienības Kalupes pagasta ceļa Nr. A1002248001264 Grancova - Petrovka ir radušies ievērojami bojājumi, ceļa klātne ir aplūdusi un grūti izbraucama. Ceļa klātnes izskalojums. Nepieciešams ceļa posma remonts p.k. 0,010-0,060 km un p.k. 0,480-0,530 km.

Pielikumā: Fotoattēli 2 lapām

Komisijas priekšsēdētājs

 J.Proms

Komisijas locekļi:

 R.Užulis
 V.Ļaksa
 I.Novicka





AKTS Nr. 1

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Kalupes pagasts

2025. gada 14. jūlija

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja;

2025.gada 14.jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr B100224800414 Ūda-Sleiži apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ceļš ir stipri izskalots vairākos posmos. Līdz ar lielajām lietavām uz Kalupes apvienības Kalupes pagasta ceļa Nr.B100224800414 Ūda-Sleiži ir radušies ievērojami bojājumi. Ceļmalu un nobrauktuvju izskalojumi, ka arī ceļa klātnes izskalojumi. Caurtekās pieskalotas smiltis. Nepieciešams ceļa posma remonts p.k.0,050 km līdz p.k.1,500 km.

Pielikumā: Fotoattēli 4 lapām

Komisijas priekšsēdētājs

 J.Proms


Komisijas locekļi:

 R.Užulis

V.Ļaksa

 I.Novicka

Fotoattēli

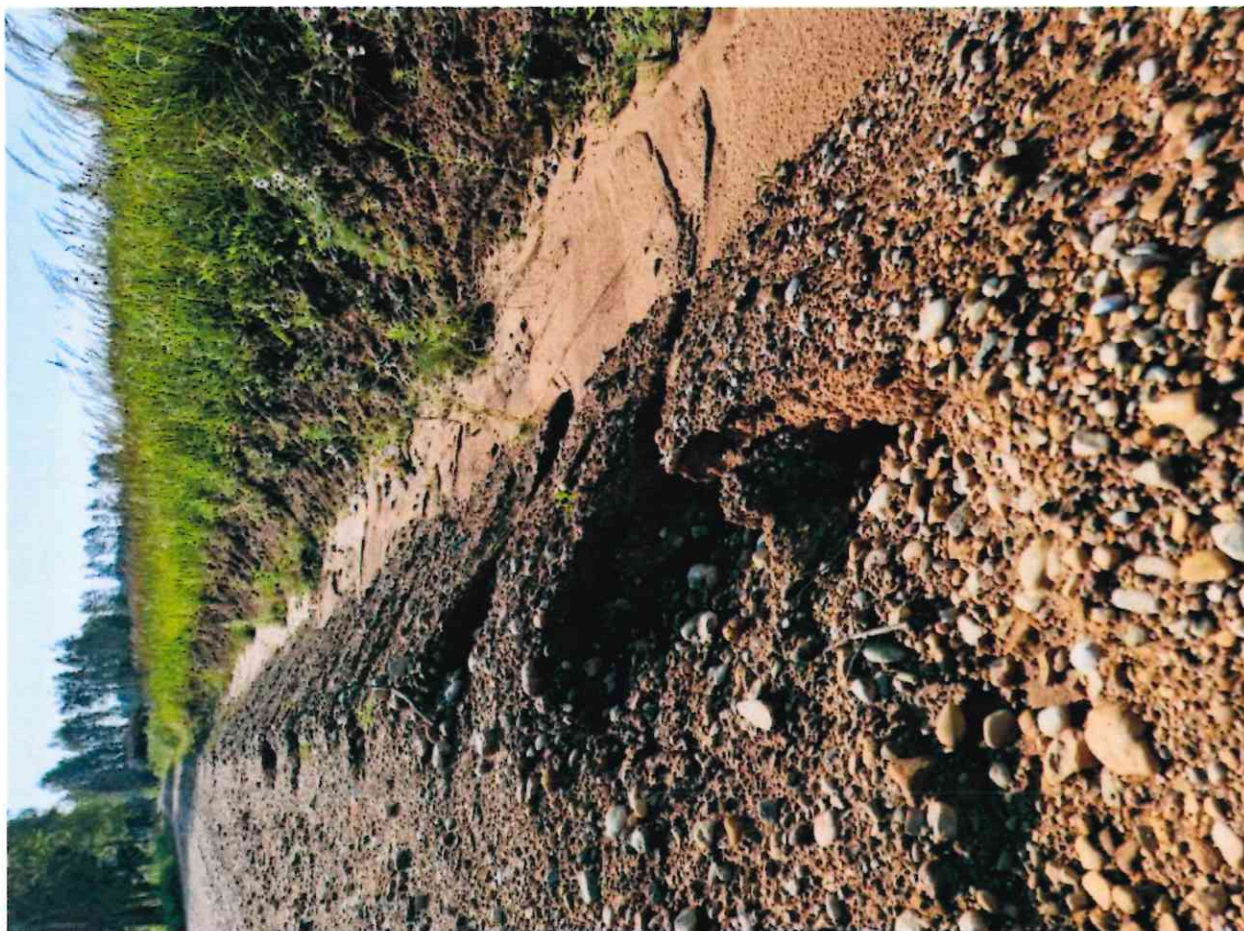







AKTS Nr. 2

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts

2025. gada 14. jūlijā

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Inženiertehniskās
nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja.

2025.gada 14. jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr.100225000134 "Muncišķi - Kudeiki", apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ir stipri izskalots ceļa posms p.k. 1,100-1,340 km.

Ceļa virskārta šajā ceļa posmā ir stipri bojāta un ir izveidojušies dziļi izskalojumi. Ceļš ir grūti izbraucams un vairāk kā 240 m braukšanai nedrošs.

Komisija ierosināja: Veikt pašvaldības ceļa Nr.100225000134 "Muncišķi - Kudeiki p.k. 1,100-1,340 km nesaistīta seguma ceļa klātnes labošanu ar drupinātas grants maisījumu 0/32s.

Pielikumā: 1 (viens) fotoattēls

Komisijas priekšsēdētājs


J.Proms

Komisijas locekļi:

R.Užulis

V.Ļaksa

I.Novicka

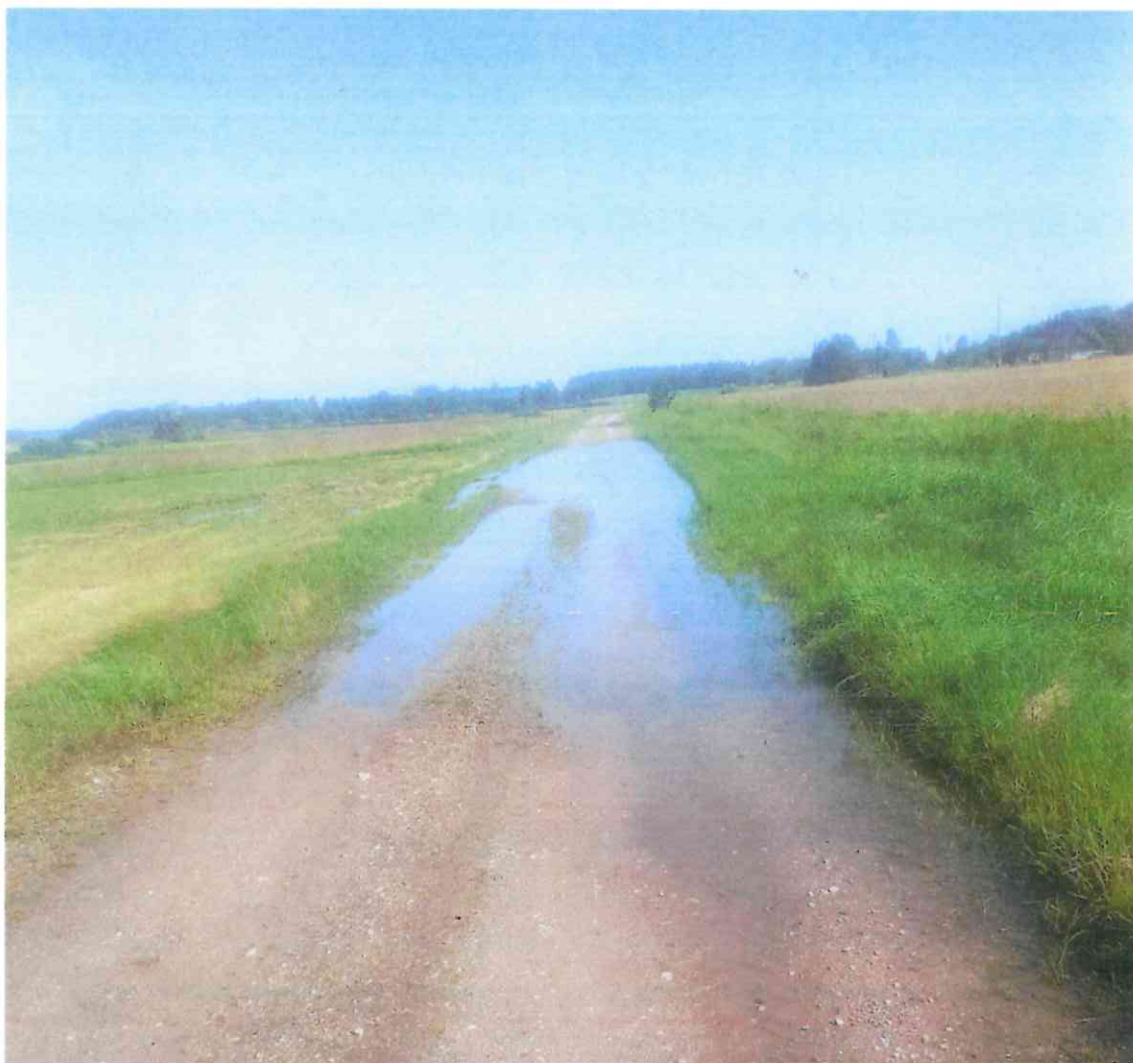

AKTS Nr. 3

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts

2025. gada 14. jūlijā

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja.

2025.gada 14. jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr.100225000141 "Sterikāni - Borski", apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ir stipri izskalots ceļa posms p.k. 0,910-1,030 km un 1,870-2,020 km. Ceļa virskārta šajā ceļa posmā ir stipri bojāta un ir izveidojušies dziļi izskalojumi. Ceļš ir grūti izbraucams un vairāk kā 270 m braukšanai nedrošs.

Komisija ierosināja: Veikt pašvaldības ceļa Nr. Nr.100225000141 "Sterikāni - Borski", p.k. 0,910-1,030 km un 1,870-2,020 km km nesaistīta seguma ceļa klātnes labošanu ar drupinātas grants maisījumu 0/32s.

Pielikumā: 2 (divi) fotoattēli

Komisijas priekšsēdētājs


J. Proms

Komisijas locekļi:

R.Užulis

V.Ļaksa

I.Novicka

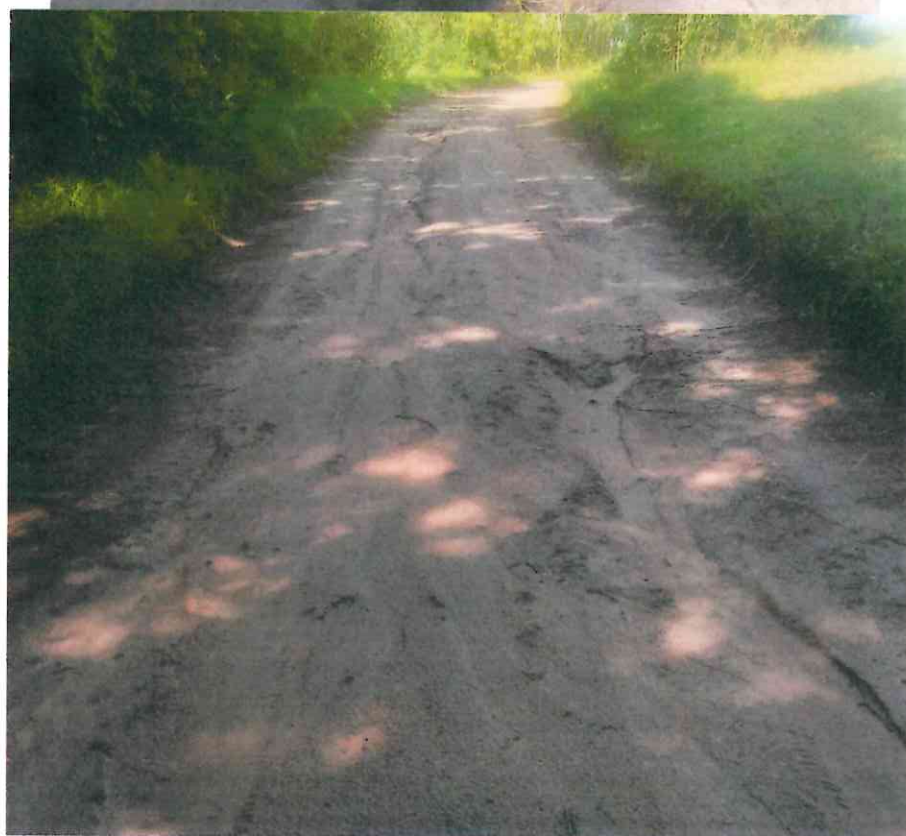

AKTS Nr. 4

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts

2025. gada 14. jūlijā

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja.

2025.gada 14. jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr.100225000149 "c. Ļūbaste -Ļūbaste", apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ir stipri izskalots ceļa posms p.k. 1,550-1,650 km un p.k.2,100-2,200 km.

Ceļa virskārta šajā ceļa posmā ir stipri bojāta un ir izveidojušies dziļi izskalojumi. Ceļš ir grūti izbraucams un vairāk kā 200 m braukšanai nedrošs.

Komisija ierosināja: Veikt pašvaldības ceļa Nr. Nr.100225000149 "c. Ļūbaste -Ļūbaste", p.k. 1,550-1,650 km un p.k.2,100-2,200 km nesaistīta seguma ceļa klātnes labošanu ar drupinātas grants maisījumu 0/32s.

Pielikumā: 2 (divi) fotoattēli

Komisijas priekšsēdētājs

J. Proms

Komisijas locekļi:

R.Užulis

V.Ļaksa

I.Novicka



AKTS Nr. 1

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Salienas pagasts

2025. gada 14. jūlijā

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja.

2025.gada 14.jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr.A100225700213 "Vecpikuļi- Dukāti - Boroviki", apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka uz ceļa ir pilnībā pārrauts ceļa posms, izskalota un bojāta caurteka un izskaloti ceļu posmi p.k.0.00 km – p.k.0,050 km, 0,900-0,950 km un 1,060-1,160 km.

Komisija ierosināja: Veikt pašvaldības ceļa Nr. A100225700213 "Vecpikuļi- Dukāti - Boroviki", remontdarbus ar Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošanu ar drupinātas grants maisījumu 0/32s un caurtekas nomaiņu vai atjaunošanu

Pielikumā: Fotoattēli uz 1 lapas

Komisijas priekšsēdētājs

J.Proms


Komisijas locekļi:

R.Užulis

V.Ļaksa

I.Novicka

Fotoattēli

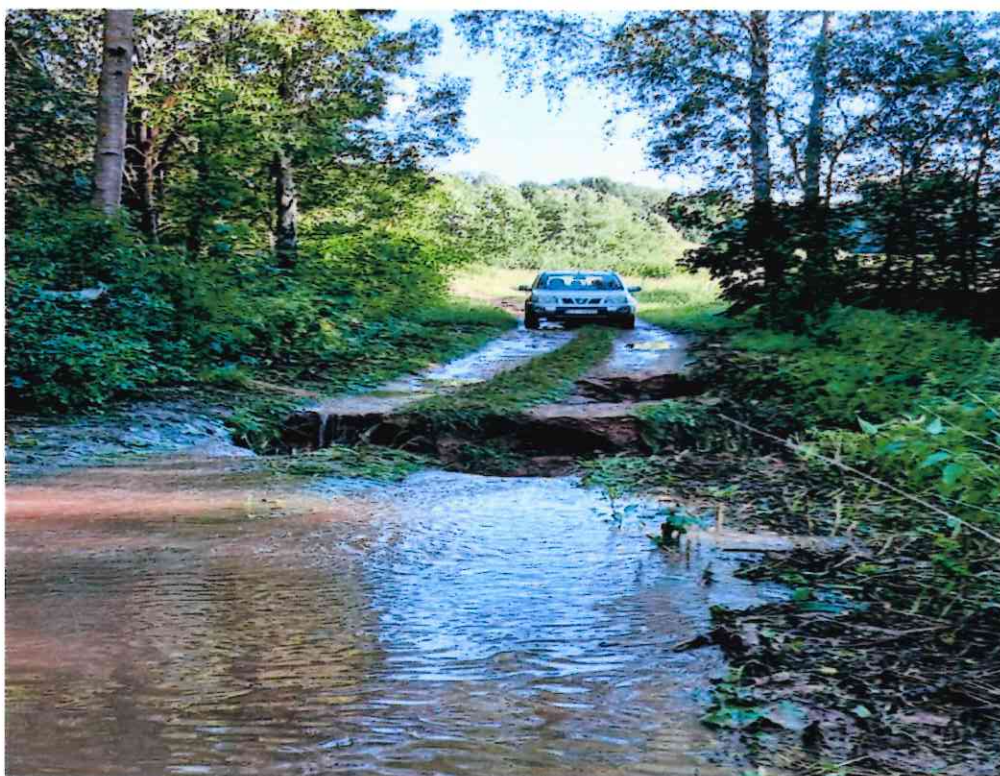

AKTS Nr. 2

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Salienas pagasts

2025. gada 14. jūlijā

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja.

2025.gada 14.jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr.A100225700217 "Riteņi – Serenieši-Vecpikuļi", apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ir izskalots ceļa posms 450 m garumā, ka arī uz ceļa atrodas lielas dziļas bedres, p.k.0,600-0,78 km, p.k. 1,700-1,800 un p.k. 1,950-2,120, kura ir bīstama satiksmei.

Komisija ierosināja: Veikt pašvaldības ceļa Nr. A0217 "Riteņi – Serenieši-Vecpikuļi", remontdarbus ar Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošanu ar drupinātas grants maisījumu 0/32s.

Pielikumā: Fotoattēli uz 1 lapas

Komisijas priekšsēdētājs

J.Proms


Komisijas locekļi:

R.Užulis

V.Ļaksa

I.Novicka

Fotoattēli

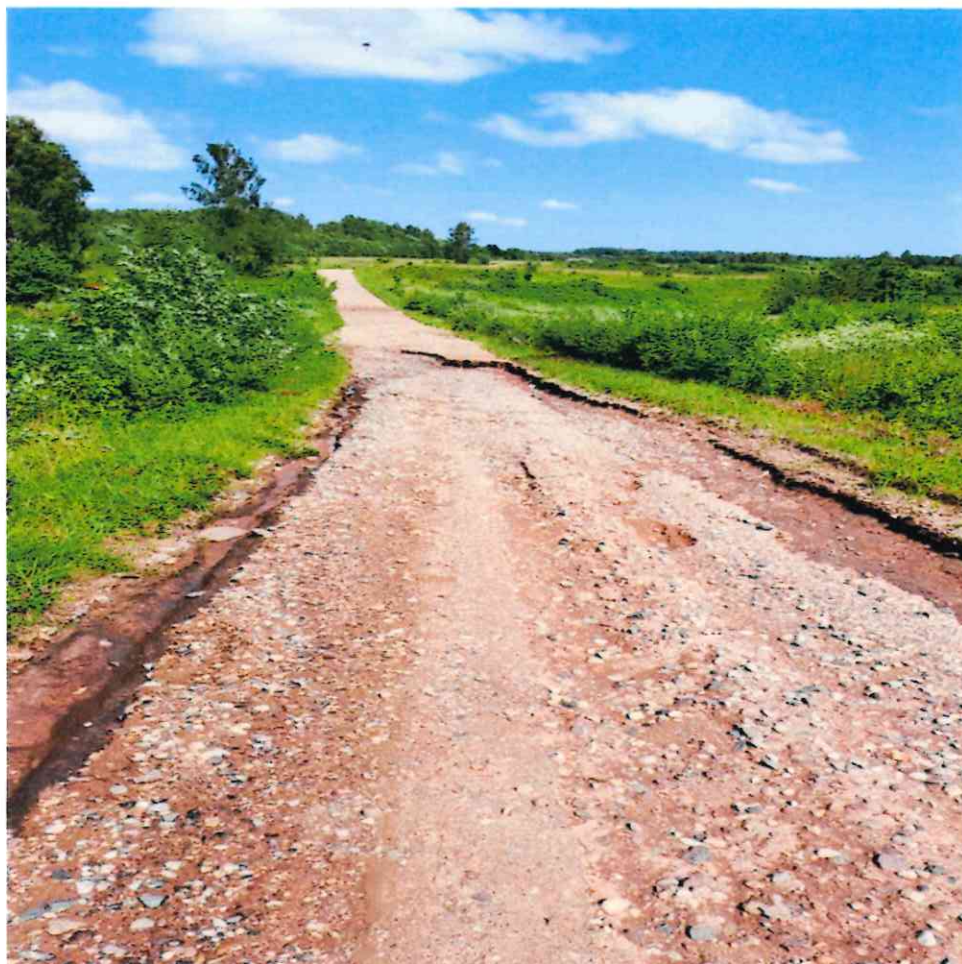

AKTS Nr. 3

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Salienas pagasts

2025. gada 14. jūlijā

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja.

2025.gada 14.jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr.A100226300303 "Sergejevo -Veselovka", apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ir izskalots ceļa posms 100m garumā, p.k.0.400 km – p.k.0,,500 km.

Komisija ierosināja: Veikt pašvaldības ceļa Nr. Nr.A100226300303 "Sergejevo -Veselovka", atjaunošanas darbus ar Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošanu ar drupinātas grants maisījumu 0/32s.

Pielikumā: Fotoattēli uz 1 lapas

Komisijas priekšsēdētājs

J.Proms

Komisijas locekļi:

R.Užulis

V.Ļaksa

I.Novicka

Fotoattēli



AKTS Nr. 5

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Salienas pagasts

2025. gada 14. jūlijā

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Liksnas apvienības pārvaldes vadītāja.

2025.gada 11.jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr.A100226300311 "Kalniņi - Tartaks", apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ir izskalots ceļa posms vairākos posmos, proti 0,390 km 0,550 km 1,050 km, 0,490 km 0,650 km 1,150 km, kā arī ir bojāta, izskalota caurteka.

Komisija ierosināja: Veikt pašvaldības ceļa Nr. A100226300311 "Kalniņi - Tartaks" atjaunošanas darbus ar Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošanu ar drupinātas grants maisījumu 0/32s un caurtekas bojājumu novēršanu

Pielikumā: Fotoattēli uz 2 lapām

Komisijas priekšsēdētājs

J.Proms

Komisijas locekļi:

R.Užulis

V.Ļaksa

I.Novicka

Fotoattēli



AKTS Nr. 5

Par plūdu postījumu apsekošanu

Augšdaugavas novads, Salienas pagasts

2025. gada 14. jūlijā

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja.

2025.gada 14.jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr.A100225700216 "Vecsalienas pag.-Aizsili-Tartaki", apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ir izskalots ceļa posms 150m garumā, p.k.1,050 km – p.k.1,070 km, kā arī ir bojāta, izskalota caurteka.

Komisija ierosināja: Veikt pašvaldības ceļa Nr. A100225700216 "Vecsalienas pag.-Aizsili-Tartaki" apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošanu ar drupinātas grants maisījumu 0/32s.


Pielikumā: Fotoattēli uz 1 lapas

Komisijas priekšsēdētājs

 J.Proms

Komisijas locekļi:

 R.Užulis

 V.Ļaksa

 I.Novicka

Fotoattēli



AKTS Nr. 1

Par lietavu radītajiem bojājumiem pašvaldības ceļiem apsekošanu

Augšdaugavas novads, Kalkūnes pagasts

2025. gada 14. jūlijā

Ar 2025.gada 14.jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.1-3/237 "Par komisijas izveidošanu pašvaldības applūstošo ceļu apsekošanai" izveidotā komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Proms Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Komisijas locekļi:

Raimonds Užulis – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas Transporta tīklu inženieris;

Valērijs Ļaksa – Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors.

Ingūna Novicka – Līksnas apvienības pārvaldes vadītāja.

2025.gada 14.jūlijā veica pašvaldības ceļa Nr.A100224700062 "Piefermas-Ezeriņi", apsekošanu pēc stiprām lietavām.

Komisija konstatēja, ka ceļš ir stipri izskalots posmā, p.k.1,020 km – p.k.1,180 km
Ceļa virskārta šajos posmos ir stipri bojāta un ir izveidojušies dziļi izskalojumi visā ceļa platumā. Ceļš ir grūti izbraucams un vairāk ka 160 metru garumā braukšanai nedrošs.

Komisija ierosināja: Veikt pašvaldības ceļa Nr. Nr.A100224700062 "Piefermas-Ezeriņi" posmā, p.k.1,020 km – p.k.1,180 km, nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošanu ar drupinātas grants maisījumu 0/32s.

Pielikumā: Fotoattēli uz 1 lapās

Komisijas priekšsēdētājs

J.Proms

Komisijas locekļi:

R.Užulis

V.Ļaksa

I.Novicka

Fotoattēli

